

# 国営沖永良部農業水利事業所からのお知らせ



止太郎 (とめたろう) 水次郎 (みずじろう) 壁菜 (べきな)

## 事業の進捗について～事業工期を3年間延長します～


国営沖永良部土地改良事業は、安定的な農業用水の確保による農業生産性の向上、農業経営の安定等を目的として、平成19年度から実施しており、今年で10年目となります。

現在、皆様のご理解・ご協力により、事業は着々と進んでおりますが、過年度に予算不足等が生じた影響で止水壁工事の進捗が遅れております。このため、当初、平成30年度の事業完了を予定しておりましたが、3年間事業工期を延長し、平成33年度事業完了(予定)とさせていただきますことになりました。皆様にはご迷惑おかけしますが、引き続き、事業へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

表. 平成28年度における事業進捗

○事業工期			○事業費ベースの進捗状況(総事業費350億円)		
平成19年度～平成33年度(予定)			65%(平成28年度末見込)		
○地下ダム止水壁工事進捗状況(計画延長2,414m)			○管水路工事進捗状況(計画延長44.1km)		
施工済37%	施工実施42%	H29以降21%	施工済83%	施工実施5%	H29以降12%
○その他の主要施設工事進捗			【参考】今年度実施予定工事		
下図参照			地下ダム止水壁関連及び矢護仁屋支線水路工事		

## 地下ダムの進捗状況図(平成28年度末イメージ)

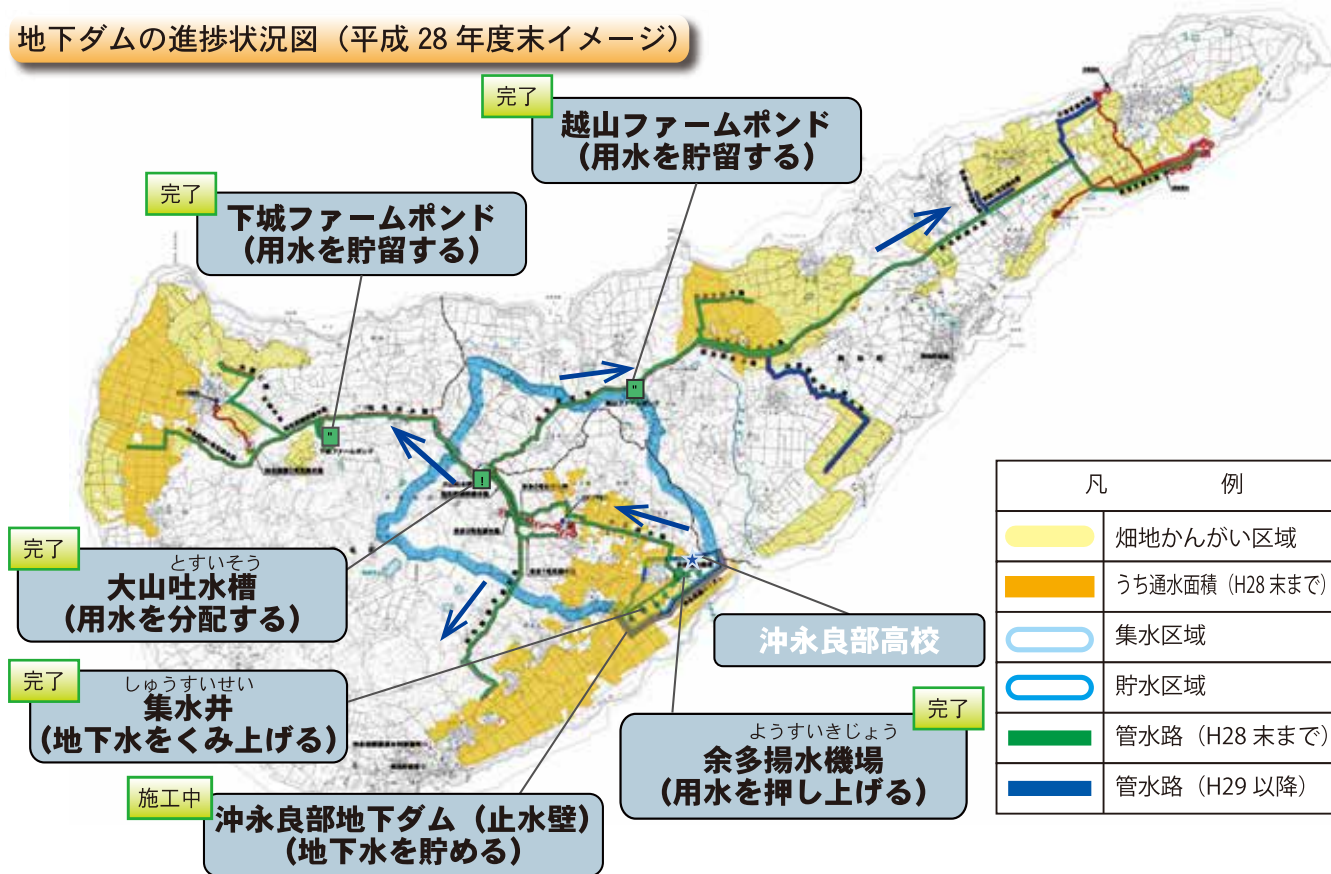

## 通水地区拡大の進捗について

事業工期は延びましたが、地下ダムの水は平成26年度から利用が始まっており、余多地区に加え、今年度は知名町において「正名、知名西部、瀬利覚」地区の一部で新たに通水を開始する計画です。

## 地下ダムQ&A

Q. なぜ事業完了前に水が使えるの？

A. 止水壁は未完成ですが、取水・送水設備が整ってきており、既存の地下水も含め、利用可能となっているからです。



「沖永良部農業水利事業」URL:<http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/15/index.html>
